


# Hlavní práce a omezení 2026

## Malé Přítočno


- 1 Od 5/2026** Budování přístupových cest kolem drážního tělesa – provizorní železniční přejezd pro přístup na stavbu
- 2 Od 5/2026** Skrývka ornice v místě budoucího P+R Malé Přítočno, které bude dočasně fungovat jako deponie materiálu a recyklační základna
- 3 Od 5/2026 - 6/2028** Budování nových náspů mezi Malým Přítočnem, Pleteným Újezdem a Velkým Přítočnem
- 4 Od 7/2026** Koordinace s výstavbou kanalizace
- 5 Od 8/2026** Budování dvou nových mostů (2 potoky)
- 6 Od 9/2026-12/2027** Nový silniční nadjezd na budoucím obchvatu
- 7 Od 9/2026-12/2027** Budování komunikace sjezdu z dálnice ke stávajícímu přejezdu

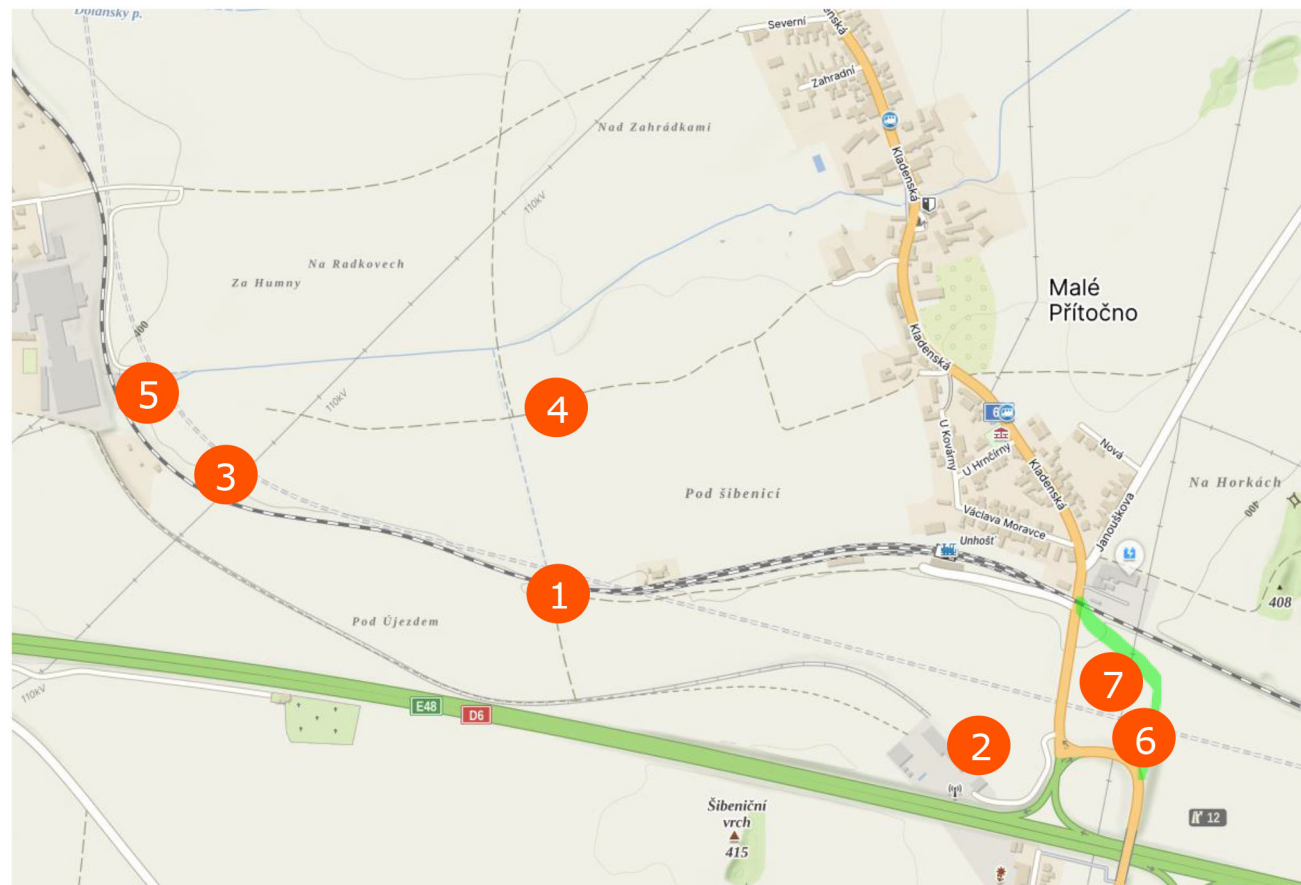

# Hlavní práce a omezení 2027-2029

## Malé Přítočno

- 8 2028 Po vybudování nového sjezdu od dálnice uzavírka stávající Kladenské a budování podchodu
- 9 2029 Technologická budova P+R, BUS terminál a parkovací plochy
- 10 Q4/2029 Omezení: Uzavření stávajícího přejezdu (3 týdny) – snesení koleje a nahrazení novým asfaltovým povrchem (tj. vzniká místo kolejí cesta) – v té době vlaky jezdí již novou stopou
- 11 Q4/2029 Oprava povrchů komunikací po stavbě
- 12 Q4/2029 Spuštění P+R

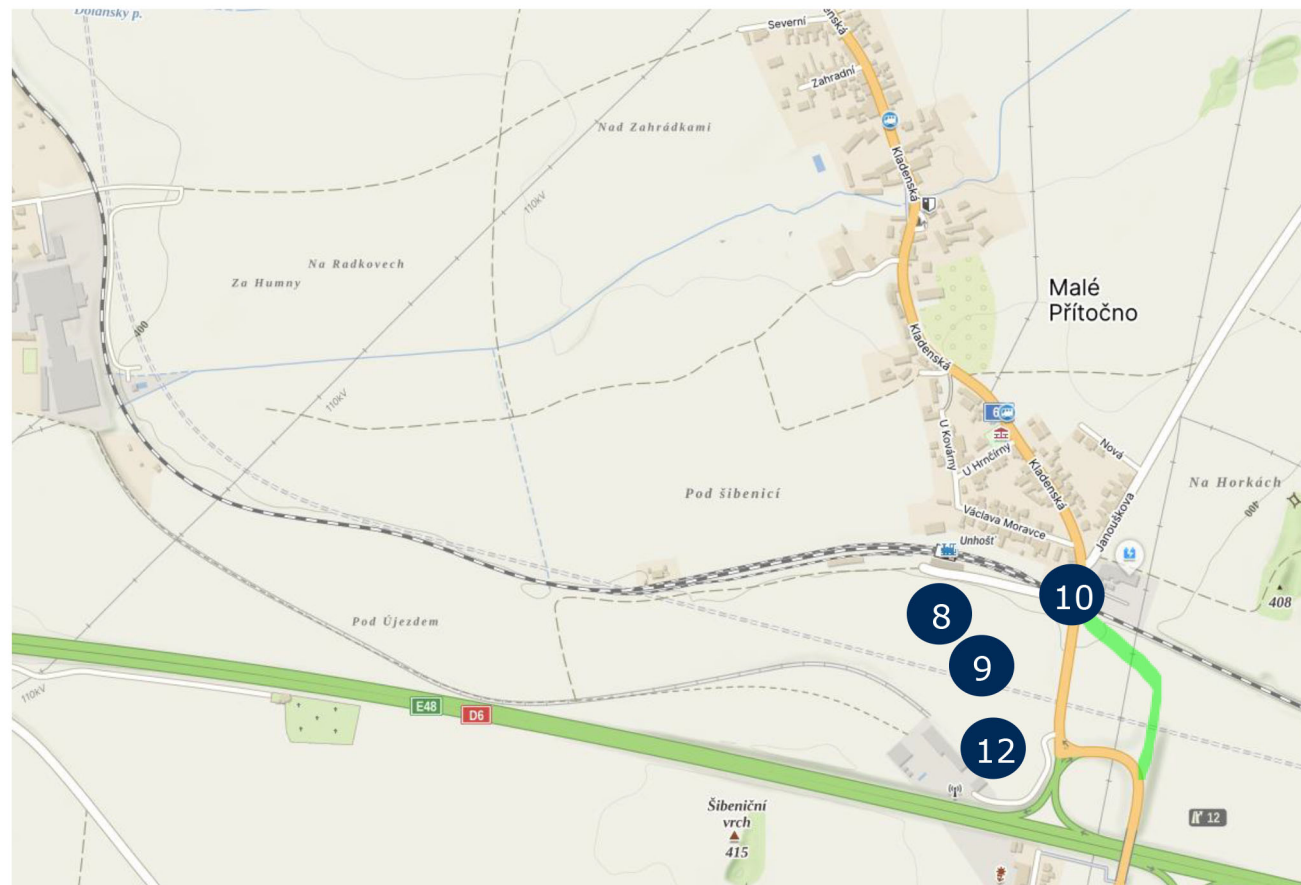




# Hlavní práce a omezení 2026

## Velké Přítočno a Pletený Újezd


- 1 Od 5/2026** Budování přístupových cest kolem drážního tělesa (primárně pro výjezd prázdných automobilů) – Ulice Zahradní Pletený Újezd. Zachování průchodu pro pěší do Velkého Přítočna a vjezdu na pole.
- 2 Od 5/2026** Budování deponie a nájezdu ke komunikaci podél trati pro navážení materiálů náspů.
- 3 Od 5/2026 - 6/2028** Skrývka ornice v prostoru budoucího drážního tělesa, budování nových náspů mezi Malým Přítočnem, Pleteným Újezdem a Velkým Přítočnem
- 4 8/2026** Nový přejezd v ulici Kožovská, nová komunikace, která umožní budování nového nadjezdu
- 5 Od 8/2026** Budování dvou nových mostů (2 potoky)

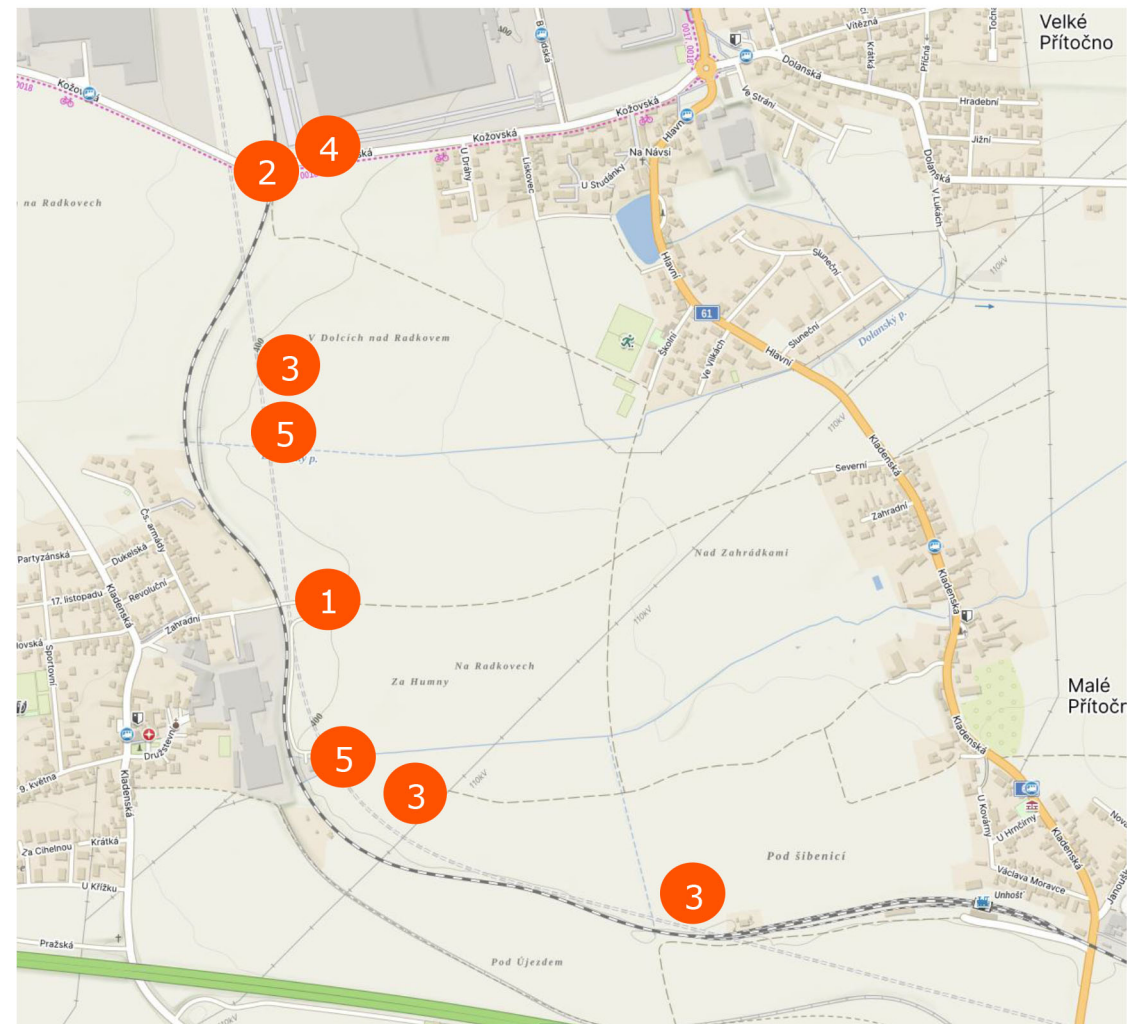

# Hlavní práce a omezení 2027-2029

## Velké Přítočno a Pletený Újezd

- 6 Od 1/2027-12/2028** Stavba nadjezdu v ulici Kožovská (Omezení: místo střídavého semaforového provozu se mění technologie, aby bylo možné zachovat obousměrný provoz bez omezení semaforů)
- 7 2028** Provizorní přístup a uzavření přejezdu navazujícího na ulici Zahradní v Pleteném Újezdu
- 8 2028-2029** Výstavba nové zastávky Velké Přítočno (nástupiště, přístřešky) a napojení na autobusové zastávky na ulici Kožovská
- 9 Q4/2029** Převezení trati do nové stopy, nahrazení původní trasy trati novým povrchem.
- 10 Q4/2029** Oprava povrchů komunikací po stavbě

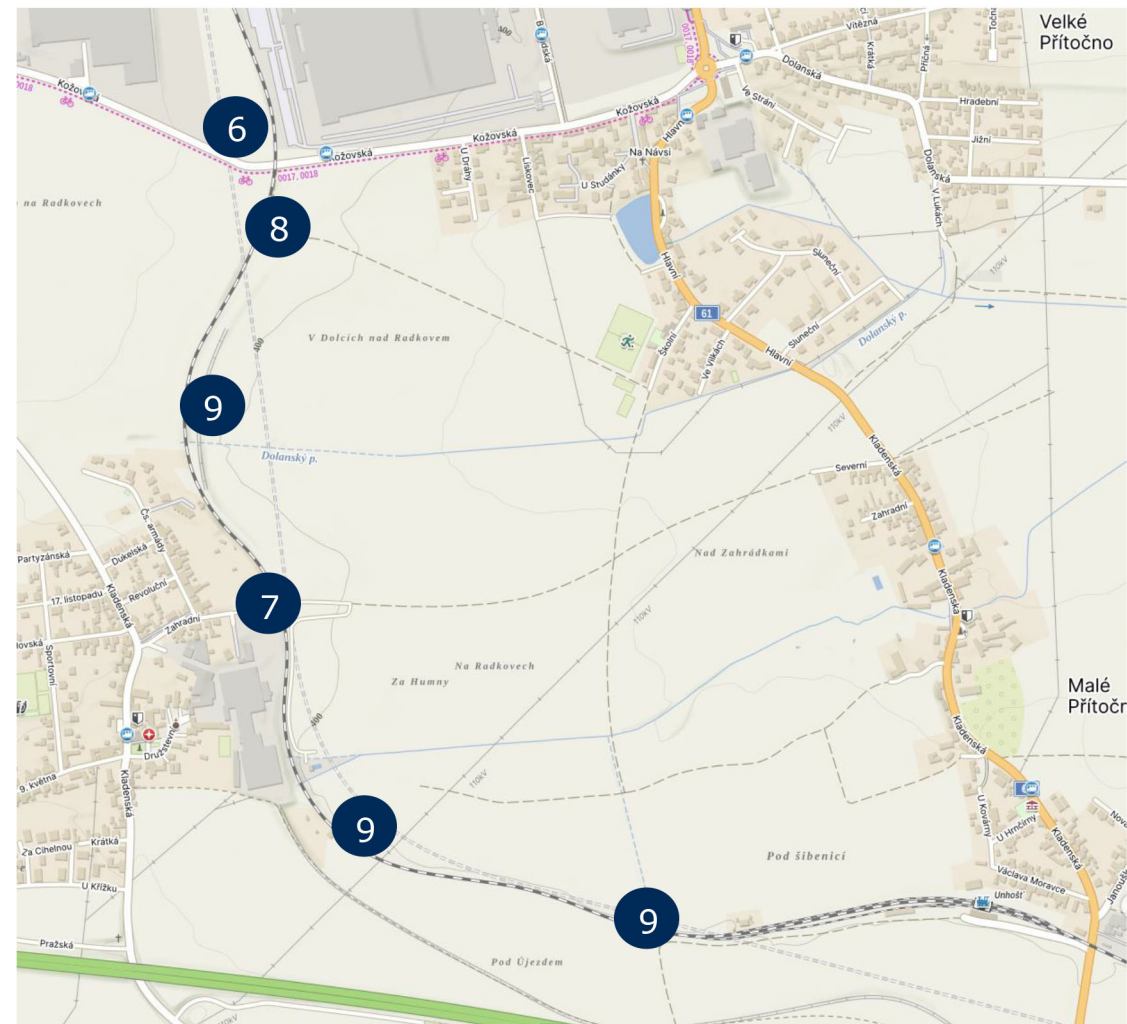



# Vícedenní plánované výluky železniční trati 2026-2029

## úsek Kladno-Hostivice

### 2026

— 18.8.-24.8.2026

### 2027

— 02/2027 2-3 týdny

— 11/2027 2-3 týdny

### 2028

— 07/2028 1 týden

— 11/2028 3 týdny

### 2029

— 03-07/2029 výluka tratí na Rudnou a Zličín

— 10-12/2029 cca 6 týdnů závěrečné propojení a zprovoznění trati

